


Замовед № 4

Дне 01.10.2012г. след посещение на място и замозаване с действителното състояние на терена на обекта, при което в определени участъци има големи наводни, които не са открити в проекта наредбата;

1. За преодоляване деформацията на терена цокъла (борда) на оградата да се издигне по силите посочени по-долу


2. След издигане на оградата, промените да се отразят в изекутивната документация

ВРЪЗКА М/У ФУНДАМЕНТ И ЦОКЪЛ

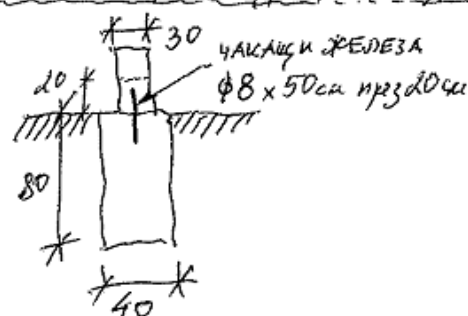

АРМИРАНЕ НА ЦОКЪЛА


ПРИ $H > 40$ см ЦОКЪЛА
ДА СЕ АРМИРА С КРЕЖА
Ф 6 с МОДУЛ 20x20 см



ЗА СТРОИТ. НАДЗОР:

- РЕЗ. ИНЖЕНЕР : ИНЖ. А. Спасьова
- ИНЖ. ПО КОЛИЧЕСТВА : ИНЖ. В. Дойков

СКИЦА ЗА ПРЕДОЛЯВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИЯТА

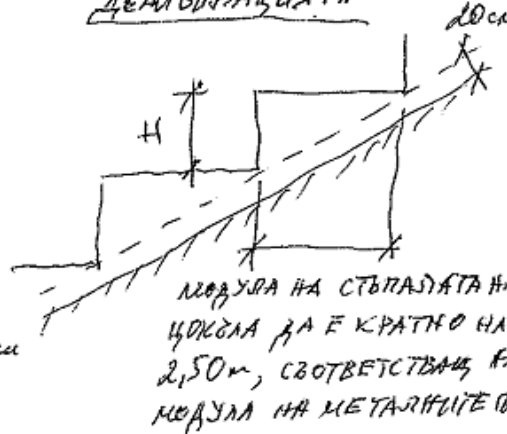

МОДУЛ НА СЪПАДАТА НА
ЦОКЪЛА ДА Е КРАТНО НА
2,50 м, СЪОТВЕТСТВАЩ Е
МОДУЛ НА МЕТАЛИТЕ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : Д-р

ТЕХ. Р-Л А. ДИМИТРОВ

ЗА АВТОР. НАДЗОР : ИНЖ. И. ДИМИТРОВ

КОЛИЧЕСТВАТА АРМАТУРА И КОФРАЖ, КОИТО ЛИПСАТ В КСС НА ОБЕКТА
ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОДРОБНА ВЕДОМОСТ ОТ
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ПРОВЕРКА ОТ СТРОИТ. НАДЗОР
